



保護者の皆様には、当初平成30年7月からの工事開始をお知らせしておりましたが、以下図A→Bのスケジュールに変更になります。

なお、こども園には予定通り平成31年4月に移行しますが、園舎竣工までの間は既存園舎において保育を実施させていただきますと考えております。最終的な保育室の配置は来年度入園する園児数が確定次第、保育室の配置変更により対応させていただきます予定です。

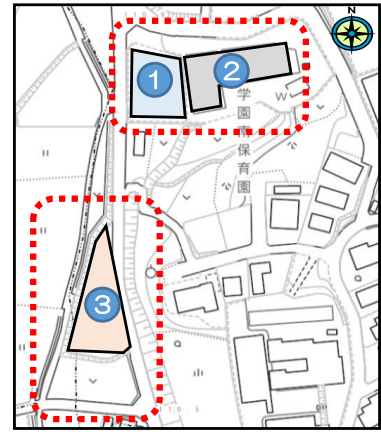


A 当初工事スケジュール

- 新園舎建築工事 平成30年 7月～平成31年 1月末
- 既存園舎解体・新園庭整備工事 平成31年 2月～平成31年 6月末
- 仮園庭等復旧工事 平成31年 7月～平成31年 7月末

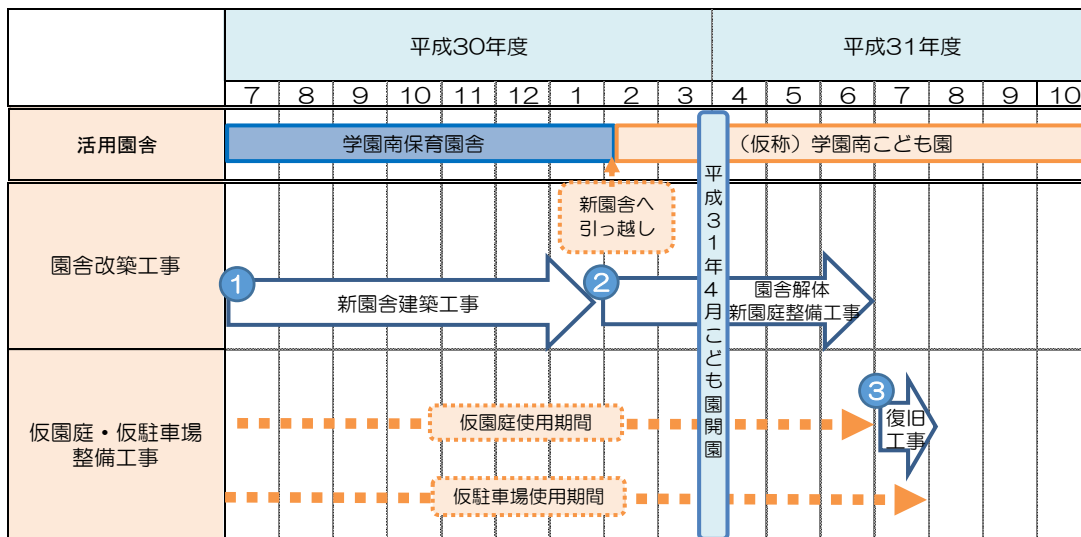

B 変更後スケジュール

- 新園舎建築工事 平成30年10月～平成31年 5月中頃
- 既存園舎解体・新園庭整備工事 平成31年 6月～平成31年 9月末
- 仮園庭等復旧工事 平成31年10月～平成31年10月末

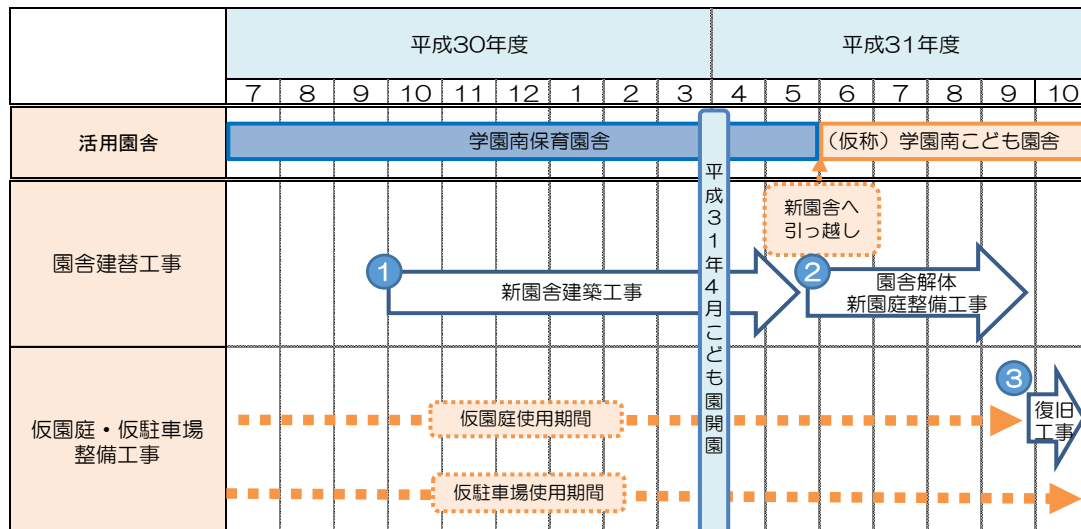

→工事開始日については、現在調整中ですが、具体的な日時が決まりましたら、改めてお手紙等でお知らせさせていただきます。
