

「(仮称)神功こども園」 について②



【日時】 平成28年 7月 11日（月） 午前 9:30～
午後 5:30～

【場所】 午前の部 神功幼稚園
午後の部 神功保育園

奈良市子ども未来部
子ども政策課

本日の説明会の内容

- ①（仮称）神功こども園への再編について
- ②神功幼稚園舎（幼児棟）改修工事の内容について
- ③神功保育園舎（乳児棟）改修工事の内容について
- ④工事スケジュールについて
- ⑤工事期間中の保育について
- ⑥神功幼稚園舎（幼児棟）改修工事の工程について
- ⑦神功保育園舎（乳児棟）改修工事の工程について
- ⑧今後の予定について




①（仮称）神功こども園への再編について-Ⅰ

再編方針

「奈良市幼保再編実施計画」に基づき、『右京幼稚園』、『神功幼稚園』、『神功保育園』を再編し一体化することで、「市立こども園」へ移行します。

移行目標年・スケジュール概要

平成29年4月からこども園への移行を予定しています。

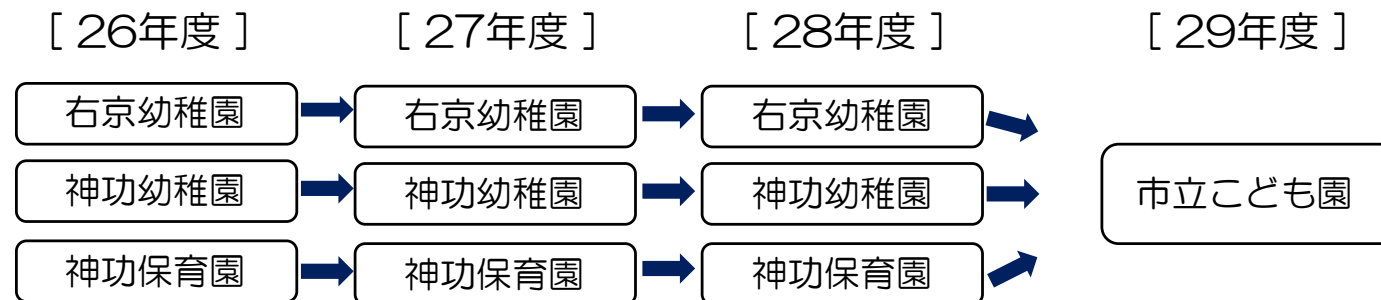

①（仮称）神功こども園への再編について-Ⅱ

神功幼稚園舎と神功保育園舎の活用について

神功幼稚園舎と神功保育園舎の両園舎を使用する「分園方式」でこども園に移行します。

概要

[活用内容]

- ・ 神功保育園舎：0～2歳児利用園舎（乳児棟）
- ・ 神功幼稚園舎：3～5歳児利用園舎（幼児棟）

- ➡ こども園移行により
- ・ 給食はそれぞれの園舎で提供
 - ・ 未就園児の子育て支援事業を実施
 - ・ 課題である園児送迎時の保護者向け駐車場を整備・確保




② 神功幼稚園舎（幼児棟）改修工事の内容について-1

平成29年4月のこども園開園にあたり、平成28年7月の幼稚園の夏休み期間開始からまず幼稚園舎の改修工事等を実施します。

工事箇所について（神功幼稚園舎）1階部分

1 F

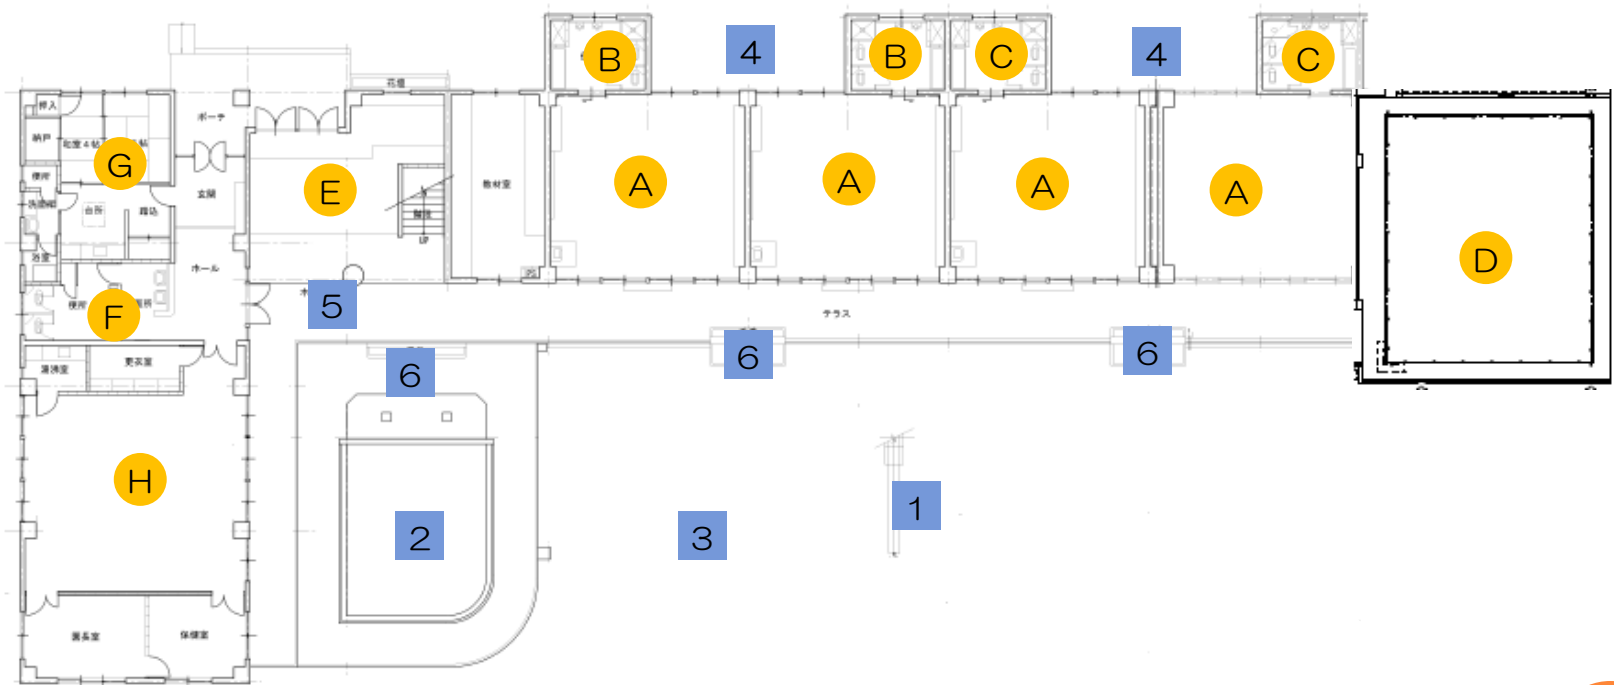

工事内容について（神功幼稚園舎）1階部分

A 保育室

- ◇ 床を磨き、木目調の塩ビシートを貼り付け美化
- ◇ 黒板を撤去し壁紙を掲示クロスに改修
- ◇ エアコン設置

B トイレ（3歳児）

- ◇ 床を湿式から乾式に改修
- ◇ 便器等の機器の更新（和式便器の洋式化）
- ◇ 手洗いは幼児用のマルチシンクを設置
- ◇ 汚物流しを設置（2部屋で1か所）

C トイレ（4歳児）

- ◇ 床を湿式から乾式に改修
- ◇ 便器等の機器の更新（和式便器の洋式化）

D 給食調理室

- ◇ 避難用階段を撤去し、給食調理室を増築
- ◇ 2階には大人用トイレと園児用の手洗い場を設置

E エントランス

- ◇ 床を磨き、木目調の塩ビシートを張り付け美化するとともに、壁を塗装
- ◇ エントランスの一角に図書コーナーを設置（畳や本棚を設置）
- ◇ 館内放送のスピーカーを設置

F 大人用トイレ

- ◇ 男女別に改修。共用トイレとしてバリアフリーの多目的トイレを設置

G 用務員室

- ◇ 職員の更衣室に改修

H 職員室


- ◇ 天井照明のLED化
- ◇ 保健室・園長室にエアコン設置

園庭などの外構

- 1 避難用滑り台を撤去し、避難用シューターを設置
- 2 プールの周辺を嵩上げし、水深が深くなるように改修し、安全対策として園庭側にフェンスを設置
- 3 園で設置している手作りの砂場の日よけ（パーゴラ）を撤去し、新しい日よけ（パーゴラ）を設置
- 4 保護者用の駐輪スペースを整備
- 5 破損している庇の改修
- 6 手洗い場防水塗装

PickUp① プール改修イメージ

プールの水深が幼児用には浅すぎるためプールサイドを嵩上げすることにより、水深を深くします。

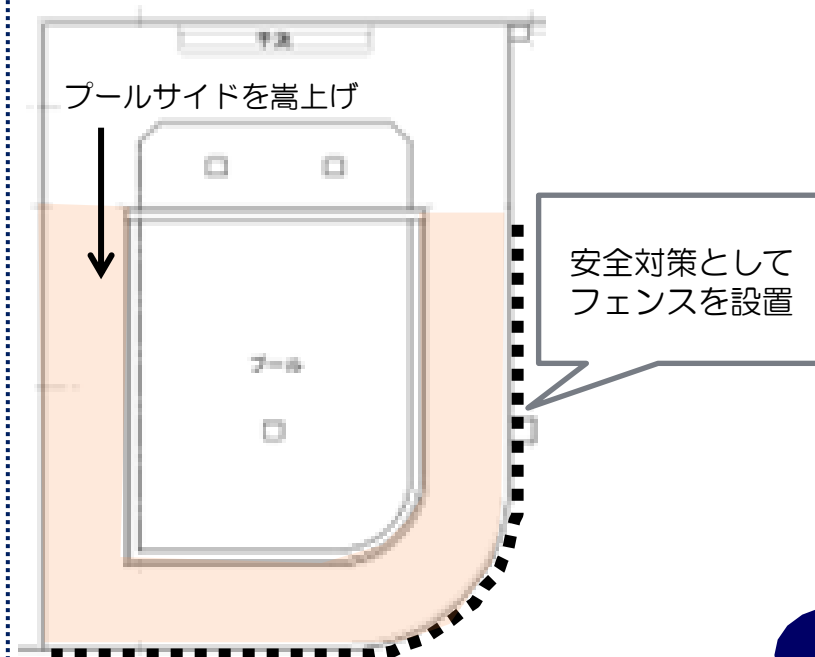


② 神功幼稚園舎（幼児棟）改修工事の内容について-2

神功幼稚園舎（幼児棟）の2階部分の改修工事の内容は、次のとおりです。

工事箇所について（神功幼稚園舎）2階部分

2F

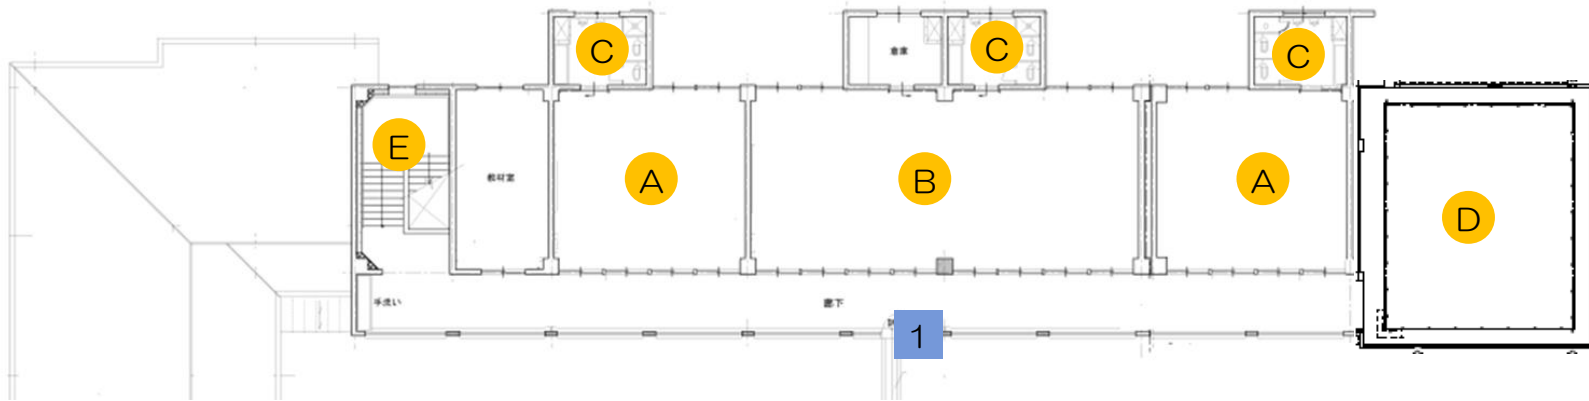

工事内容について（神功幼稚園舎）2階部分

A 保育室

- ◇ 床を磨き、木目調の塩ビシートを貼り付け美化
- ◇ 黒板を撤去し壁紙を掲示クロスに改修
- ◇ エアコン設置

B リズム室

- ◇ 床を磨き、木目調の塩ビシートを貼り付け美化
- ◇ 黒板を撤去し壁紙を掲示クロスに改修
- ◇ エアコン設置
- ◇ 既設の家具等を撤去するとともに新たに本棚等を新設し図書コーナーを設置

C トイレ（5歳児等）

- ◇ 床を湿式から乾式に改修
- ◇ 便器等の機器の更新（和式便器の洋式化）

D 給食調理室

- ◇ 避難用階段を撤去し、給食調理室を増築
- ◇ 2階には大人用トイレと園児用の手洗い場を設置

E 階段踊り場

- ◇ 天井照明をLED化

園庭などの外構

- 1 避難用滑り台を撤去し、避難用シューターを設置


PickUp② エントランス改修イメージ

床は木の温もりをイメージ
出来るように木目調の塩ビ
シートに改修

図書コーナー

図書コーナーイメージ


子ども達の遊び場としても活用できるエントランス、その中でゆったりと落ち着いて絵本に触れる事ができる空間を園の先生方のアイデアから設計しました。

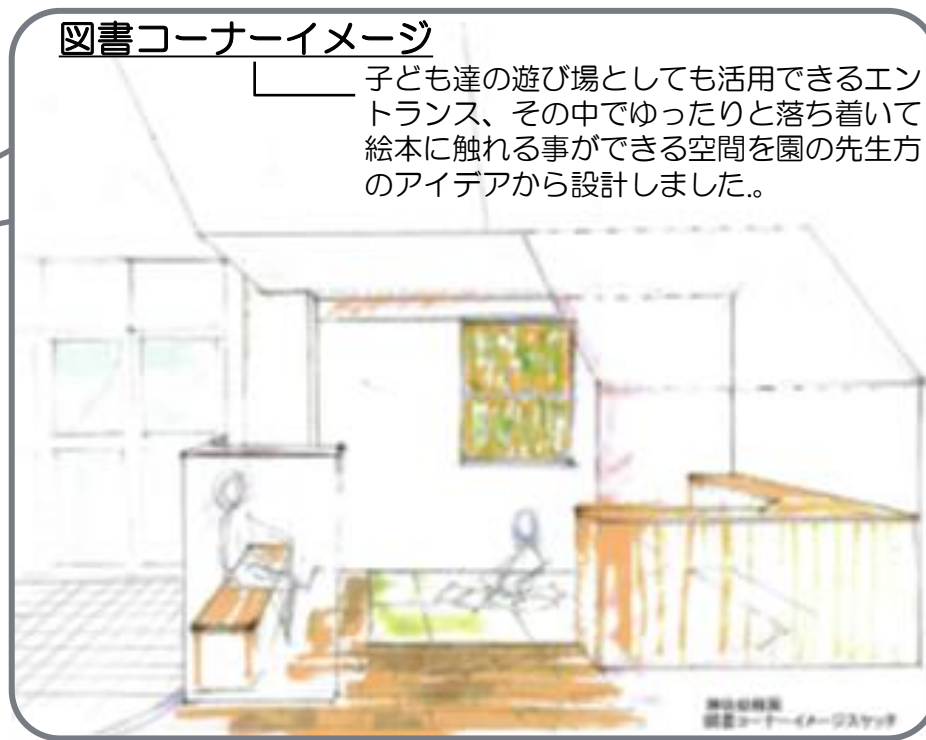

③神功保育園舎（乳児棟）改修工事の内容について-1

保育園舎の改修工事については、両園の運動会が終了した平成28年11月から行います。

工事箇所について（神功保育園舎）1階部分

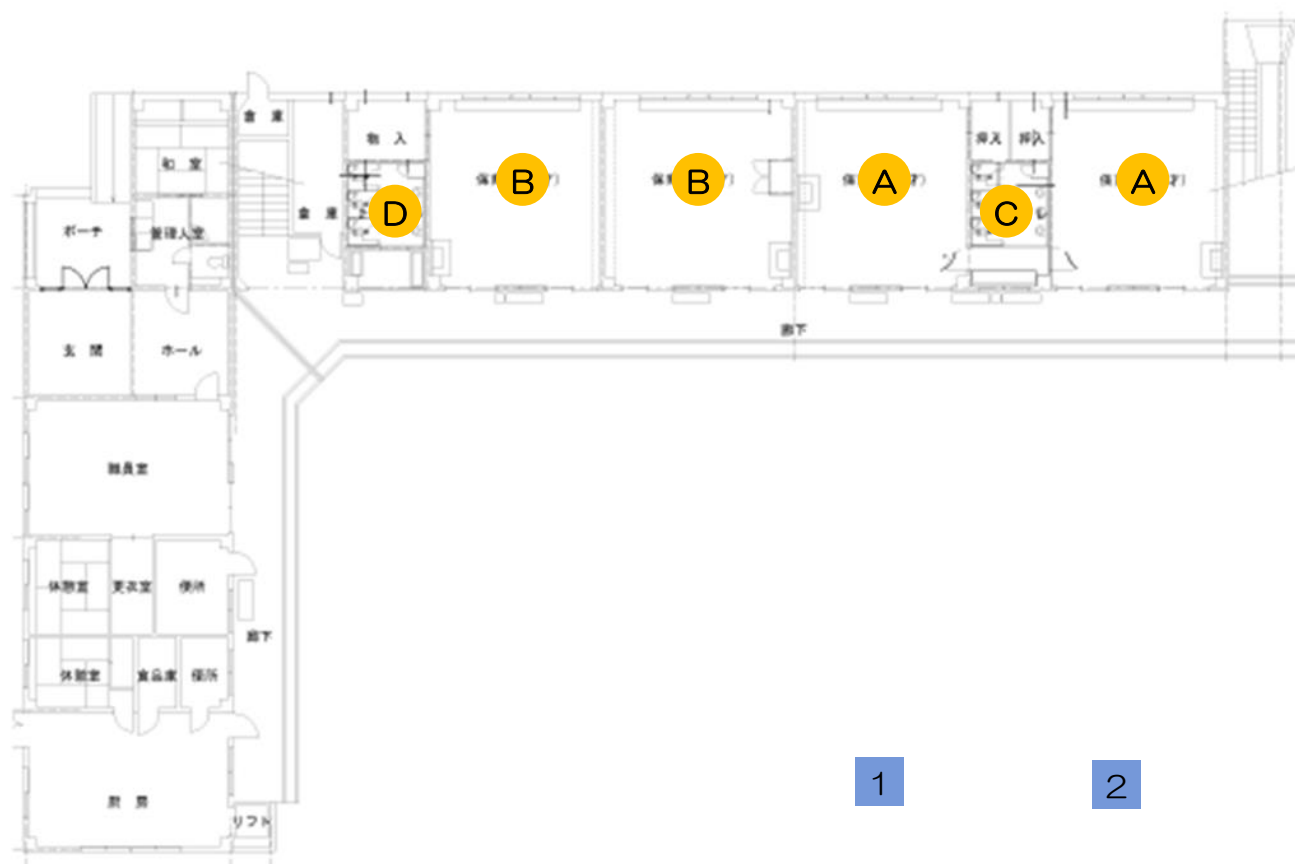

1F

1

2

工事内容について（神功保育園舎）1階部分

A 保育室（1歳児）

- ◇ 床を磨き、木目調の塩ビシートを貼り付け美化
- ◇ 壁紙を全面張替え
- ◇ 手洗い用洗面台の機器更新

B 保育室（2歳児）

- ◇ 床を磨き、木目調の塩ビシートを貼り付け美化
- ◇ 壁紙を全面張替え
- ◇ 手洗い用洗面台の機器更新

C トイレ（1歳児用）

- ◇ 床を湿式から乾式に改修
- ◇ 乳児用シャワー、汚物流し、折り畳み式オムツ交換台の新設
- ◇ 便器の洋式化や手洗い等の機器更新

D トイレ（2歳児用）

- ◇ 床を湿式から乾式に改修
- ◇ 乳児用シャワー、汚物流しの新設
- ◇ 便器の洋式化や手洗い等の機器更新
- ◇ 開放廊下からの出入り口に目隠しのためハンガードア新設


園庭などの外構

- 1 ジャングルジム撤去
- 2 すべり台撤去

その他

- 撤去する遊具のかわりに園舎改修後に乳児用の築山を設置予定


PickUp③ 2歳児用トイレの扉改修イメージ

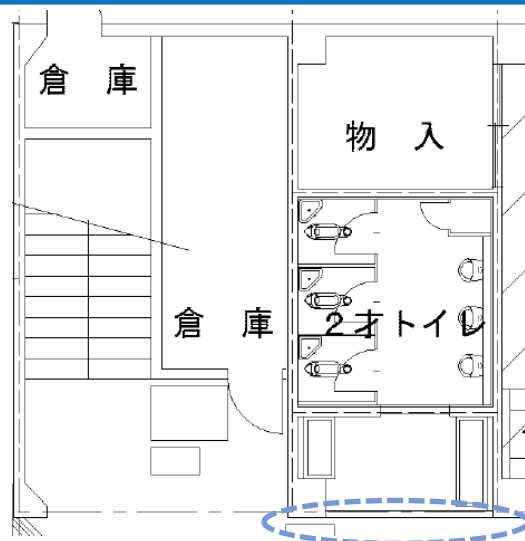

扉がなく外からトイレ
の中が見えてしまう

ハンガードアを設置

2歳児用として使用予定のトイレは現状開放廊下との境界に扉がなく、外からトイレが丸見えとなっているので、目隠しのため片引きのハンガードアを設置します。

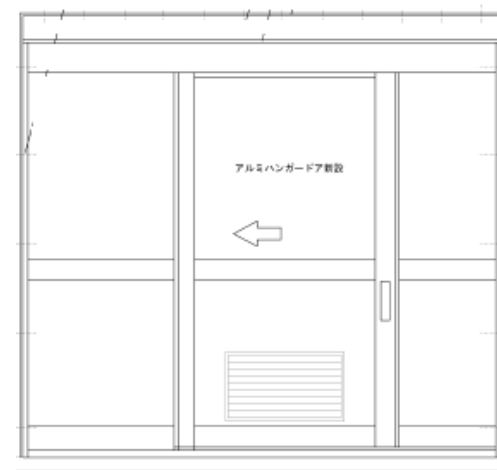


③神功保育園舎（乳児棟）改修工事の内容について-2

神功保育園舎（乳児棟）の2階部分の改修工事の内容は、次のとおりです。

工事箇所について（神功保育園舎）2階部分

2F

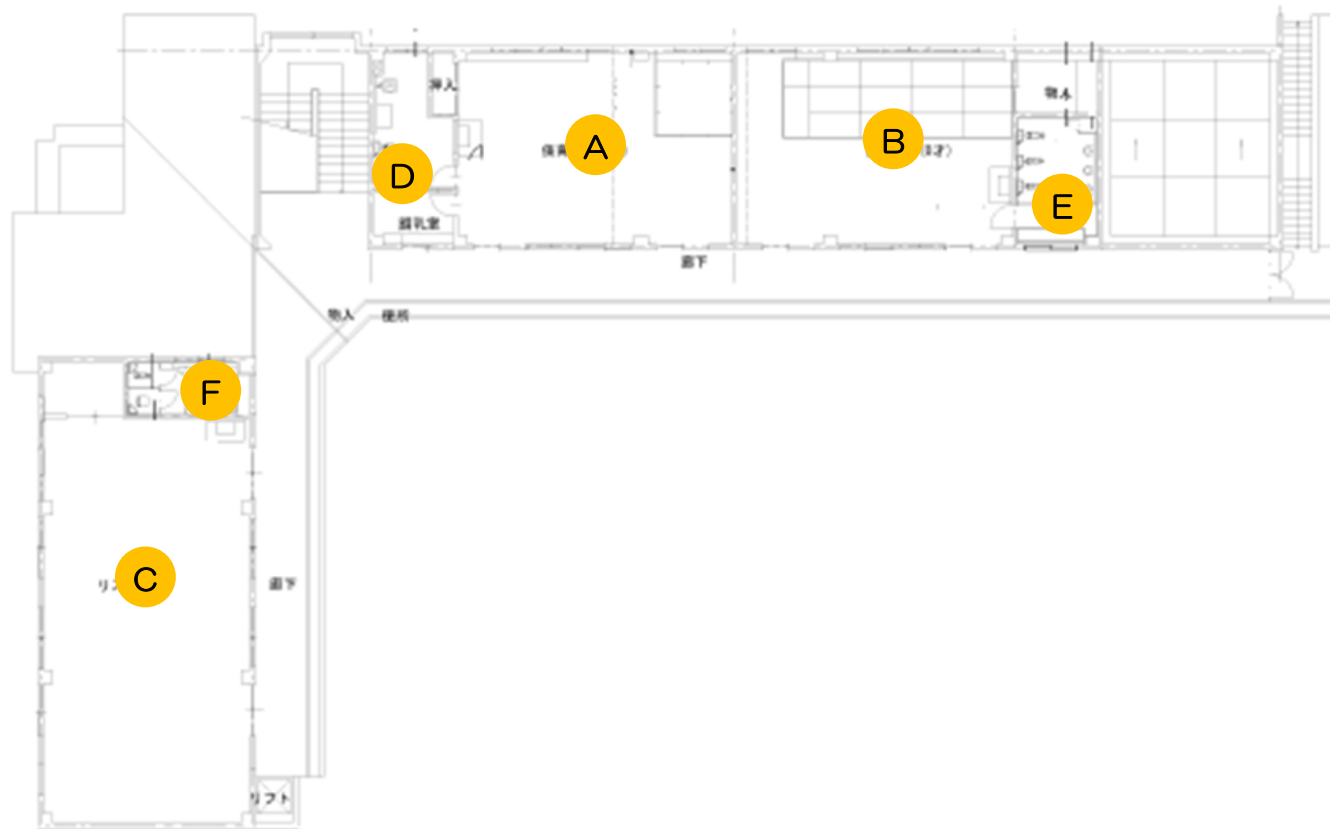

工事内容について（神功保育園舎） 2階部分

A 保育室（0歳児低月齢児）

- ◇ 床を磨き、木目調の塩ビシートを貼り付け美化
- ◇ 壁紙を全面張替え
- ◇ 畳スペースの段差解消
- ◇ 蛍光灯を2分割（フローリングと畳の間）で作動できるように改修
- ◇ その他 手洗い用洗面台の撤去や換気扇取替え

B 保育室（0歳児高月齢児）

- ◇ 床を磨き、木目調の塩ビシートを貼り付け美化
- ◇ 壁紙を全面張替え
- ◇ 蛍光灯を2分割（フローリングと畳の間）で作動できるように改修
- ◇ その他 手洗い用洗面台の機器更新や換気扇取替え

C リズム室

- ◇ 壁紙を全面張替え
- ◇ 収納スペース新設
- ◇ 手洗い用洗面台の機器更新
- ◇ 使用していない暖房器具の撤去

D 沐浴室

- ◇ 床・壁等の美化
- ◇ 便器の撤去


E トイレ（0歳児高月齢児用）

- ◇ 床を湿式から乾式に改修
- ◇ 乳児用シャワー、折り畳み式オムツ交換台の新設
- ◇ 便器の洋式化や汚物流し等の機器更新


F トイレ（大人・子ども用）

- ◇ 床・壁等の美化

PickUp④ 0歳児（低月齢児）畳スペース改修イメージ

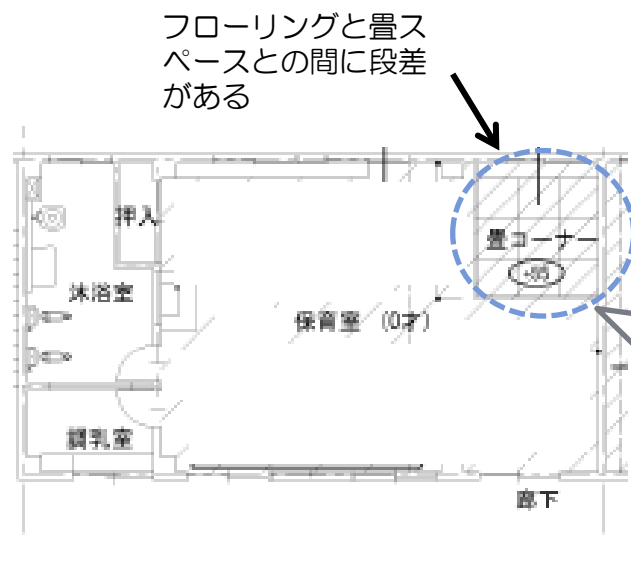

畳スペースの段差解消を実施

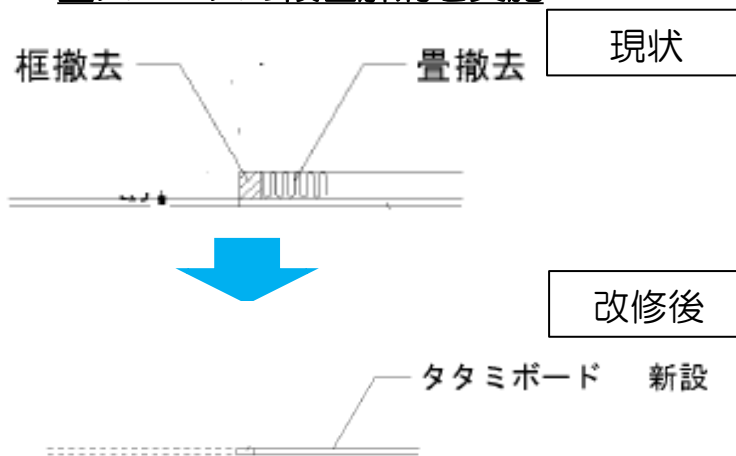

④ 工事スケジュールについて

工事スケジュールについて

市立こども園への移行に向け、神功幼稚園舎と神功保育園舎の両園舎について、必要な施設改修工事を神功幼稚園の夏休み開始からⅠ期工事（幼稚園舎）とⅡ期工事（保育園舎）に分けて行います。

現在のスケジュール予定

	平成28年度									平成29年度
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
神功幼稚園舎 (Ⅰ期工事)	Ⅰ期工事 園舎改修工事 給食調理室増築工事 夏休み期間 神功幼稚園での保育期間 幼稚園児(4、5歳児) 保育園児(2～5歳児)は幼稚園舎									平成29年4月 こども園開園
神功保育園舎 (Ⅱ期工事)	Ⅱ期工事 両園運動会終了後 園舎改修工事 保育園児(0～1歳児)は保育園舎									

⑤ 工事期間中の保育について

工事期間中の保育について

○神功保育園舎の工事においては、余裕の保育室等がなく、また幼稚園のような長期の休暇もないため、工事と保育を並行して行うことができません。

そのため、工事期間中に、園児が安全・快適に過ごすための臨時措置として、11月からのⅡ期工事（保育園舎）では、2～5歳児の保育園児について、

『神功幼稚園舎での保育』を実施します。

また、神功幼稚園舎での保育を実施することにより、余裕の保育室等を活用することで、保育園舎において工事と並行しながら0、1歳児の保育を実施します。

○なお、騒音や振動、粉塵などが発生する工事については、出来る限り園の休日や園児がいない時間帯で行います。また、フェンス等で仮囲いを行い工事と保育を分離することで、安全対策を行います。

⑥ 神功幼稚園舎（幼児棟）改修工事の工程について- I

I 期工事（幼稚園舎）の夏休み期間の工事について

工事期間


- ・ 幼稚園の夏休み期間中（平成28年7月20日～8月末までを予定）

工事内容

- ・ 保育室やトイレ等の内部改修工事、プールやパーゴラなどの外部改修工事及び給食調理室の増築工事を実施

Point

- ・ この期間は、園児がいないため園庭をフェンス等で区切りませんが、夏野菜を栽培している畑の水やり等は工事業者と調整し、日時等を指定することで、工事期間中も継続できるように配慮します。

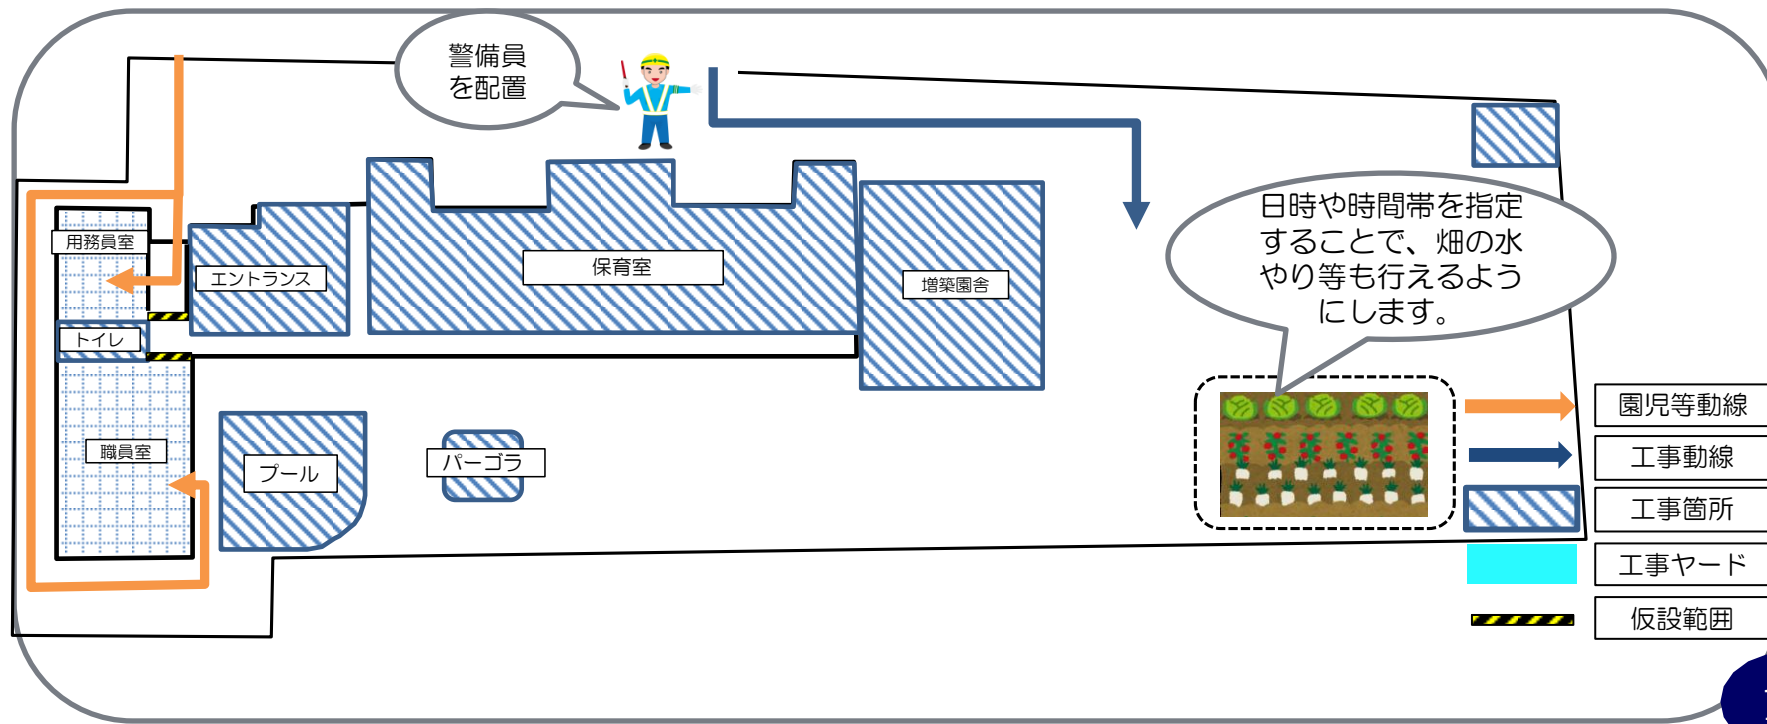

⑥ 神功幼稚園舎（幼児棟）改修工事の工程について-Ⅱ

I 期工事（幼稚園舎）9月～12月までの工事について


工事期間

- 平成28年9月～12月までを予定

工事内容

- 引き続き給食調理室の増築工事を実施（～12月まで）
※9月当初に用務員室の内部改修工事を実施
- 9月からは、保育と工事を分離させるためフェンスで仮囲いを行います。
- 9月当初に用務員室の改修工事を行います。工事の規模は小さいので、園運営に大きな影響はありません。改修工事については、時間帯を指定したり、必要に応じ警備員を配置することで、安全対策を行います。

Point

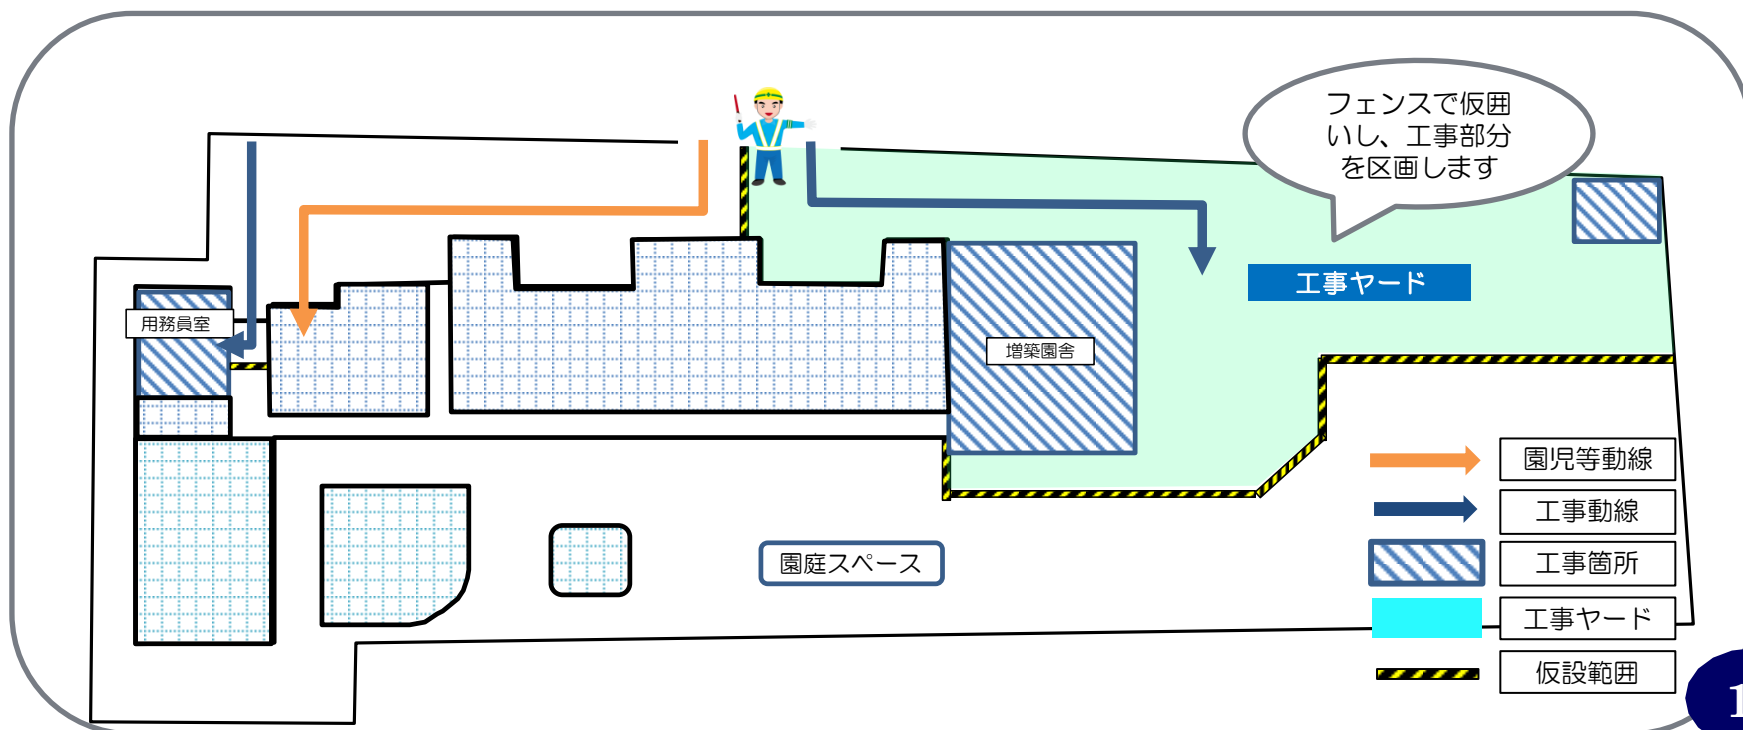

⑦ 神功保育園舎（乳児棟）改修工事の工程について- I

Ⅱ期工事（保育園舎）11月～12月までの工事について

工事期間



- 両園の運動会終了後
平成28年11月～12月までを予定

工事内容

- 0歳児保育室とリズム室を除く、
保育室及び附設するトイレの改
修工事を実施

Point

- 11月からは
2～5歳児の保育園児が幼稚園舎
に移動し保育を実施
- 0歳児は現状まま0歳児保育室
1歳児はリズム室に移り保育を実施
- コンクリート床の破砕作業等の大
きな騒音と粉塵が発生する工事は
出来る限り休日に集中して実施

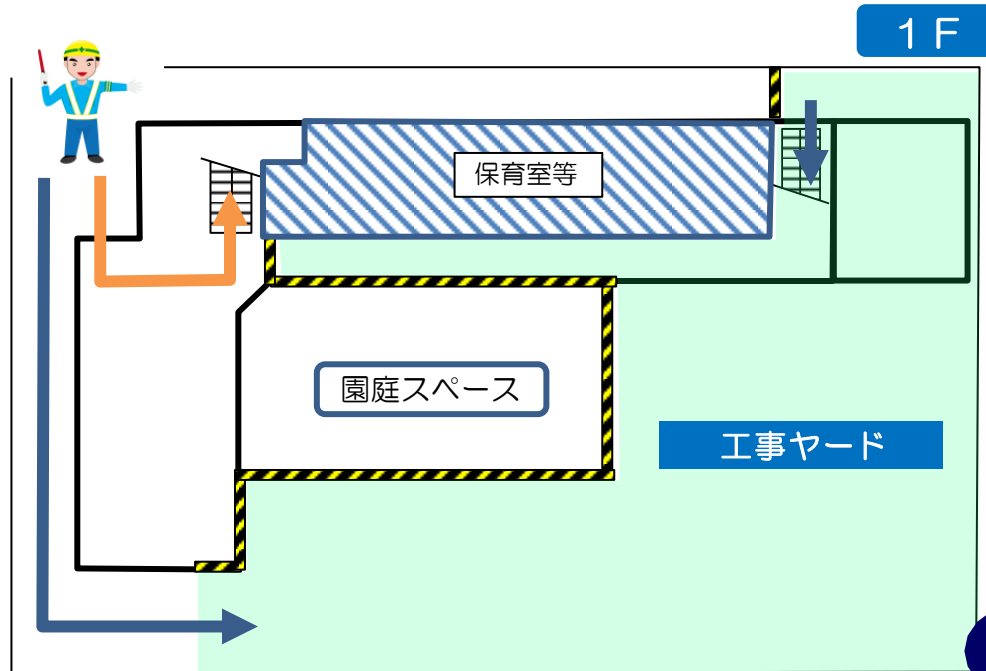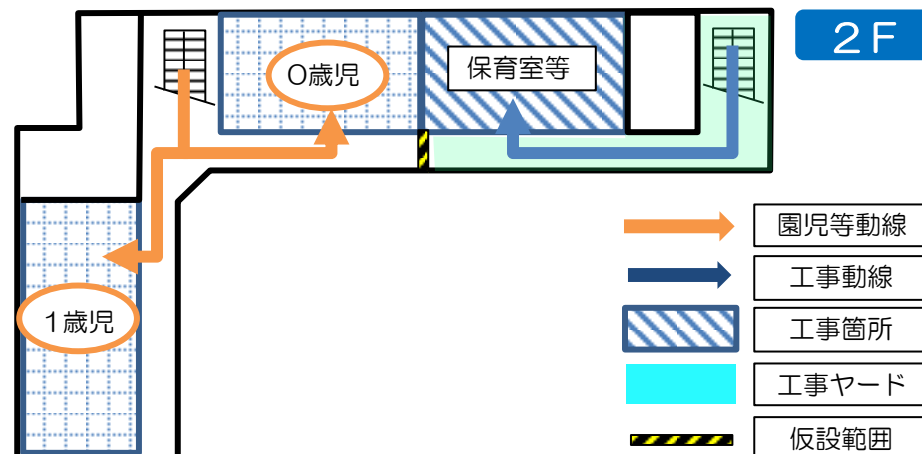

⑦ 神功保育園舎（乳児棟）改修工事の工程について-Ⅱ

Ⅱ期工事（保育園舎）1月～2月末までの工事について

工事期間


- 平成29年1月～2月末までを予定

工事内容

- 園舎2階の
0歳児保育室と沐浴室、
リズム室とリズム室横トイレ
の改修工事を実施

Point

- 0歳児と1歳児は1階の新たに乳児
使用に改修した保育室に移り保育
を実施
- この期間は、主に2階の改修工事を
行いますが、工事作業は仮設する
足場を通して行うので、保育への
影響は最小限に抑えられます。

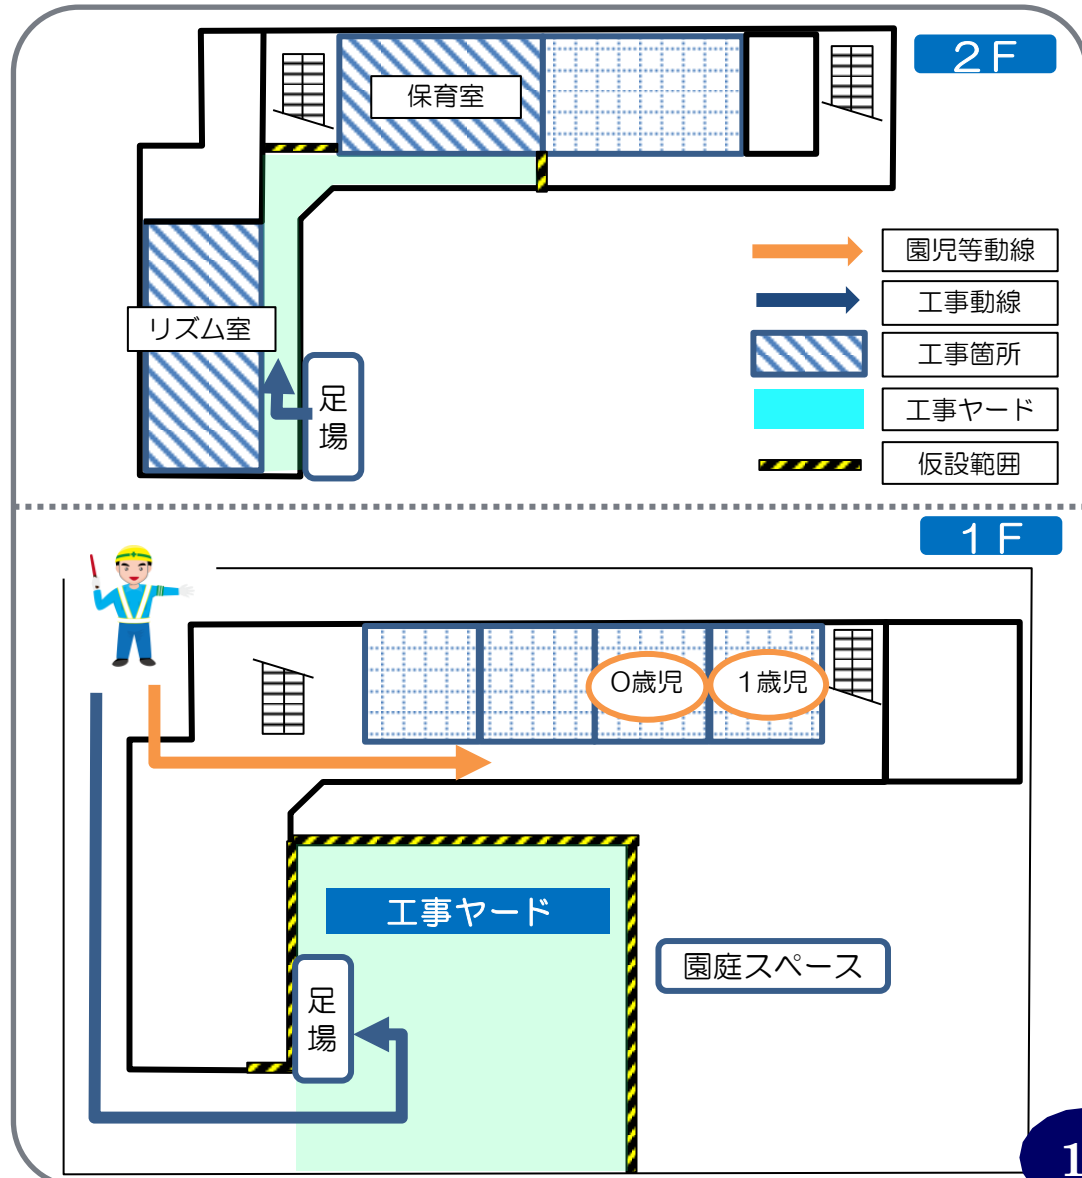

⑧ 今後の予定について

11月からの神功幼稚園舎での保育等について

- 11月からのⅡ期工事（神功保育園舎）からは、2～5歳児の保育園児について、神功幼稚園舎での保育の実施を予定しています。具体的な神功幼稚園舎での保育の内容については、幼稚園舎の夏休み工事の終了後、Ⅱ期工事開始までの間で改めて、お知らせしたいと考えています。
- また、Ⅱ期工事開始までの間で、11月からの神功幼稚園舎での保育時の送迎方法など具体的な内容を記した冊子を配付させていただきます。工事にあたり、ご心配をお掛けいたしますが何卒よろしくお願いします。
- 工事の進捗状況については、工事の節目節目に、工事のお知らせを配布することで、お知らせしていきます。

[問い合わせ先について]

本日の説明会の内容や、奈良市の取組についてご不明な点があれば、随時お問い合わせください。

子ども政策課の問い合わせ先

[担当課] 奈良市 子ども政策課（市役所中央棟3階）

[TEL] 34-4792

[FAX] 34-4798

[MAIL] kodomoseisaku@city.nara.lg.jp

[幼保再編に関する市ホームページ]

➤<http://www.city.nara.lg.jp/www/genre/0000000000000000/1366066836305/index.html>

