

保護者の皆様におかれましては、平素から奈良市の教育・保育行政にご理解とご協力をいただき、ありがとうございます。このたび平成31年2月16日（土）に開催いたしました説明会の概要を以下のとおりまとめましたので、配布いたします。

今後も定期的に説明会やお知らせをとおして、取り組み状況をお伝えさせていただきたいと考えておりますので、ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。

## 1 当日の説明内容について

### (1) 学園南こども園の工期変更について

- ・ 昨年10月から始まった改築工事につきましては、現在基礎工事がおおよそ終了し、3月は鉄骨の建方を予定しておりますが、以前に提示させていただいておりました工事スケジュールから現時点において遅れが発生している状況でございますので、報告させていただきます。
- ・ 園舎の竣工については、直近にお示しさせていただきましたスケジュールにおいては、5月中頃の竣工を予定しておりますが、現在判明したスケジュールでは、竣工が7月末となり、新園舎への引っ越しは、関係機関の検査等が終了する8月中頃を予定しております。その後、園舎解体新園庭の整備が12月中旬まで、仮園庭の復旧作業が1月中頃を予定しております。
- ・ 今回スケジュールに遅れが生じた理由としましては、オリンピック事業やそれに伴う再開発事業等により、資材等の納期に遅れが生じ、それに伴い工程にも遅れが生じた状況です。今回鉄骨工事着手の目途が立ったことから、変更後のスケジュールの変更をご説明させていただける状況となりました。
- ・ 今後の園運営についてご心配いただいている状況ではあると思いますが、開園当初の1号認定の4,5歳児については、園児数が少ない状況でございますので、新入園児の人数を含めても既存園舎での保育は部屋面積の国基準も満たしており、引っ越しまでの園運営は可能です。また、今後の運動会等の行事等は園と相談しながら実施させていただきます。
- ・ 保護者の皆様には工事について多大なご理解とご協力を頂いておりますが、今回このような状況から工事が遅れてしまい大変申し訳ございません。関係者一同新園舎でよりよい教育・保育を提供できるように努めてまいりますので、何卒ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

### (2) 4月からのクラス配置について

- ・ 来年度4月時点の園児数から2歳児の保育室を比較的面積の大きい保育室1室に集約し、5歳児を現在の保育室と、今まで2歳児として活用していた保育室を活用することにより、新園舎竣工まで保育を実施させていただくこととなりました。
- ・ なお、0歳児、1歳児、3歳児、4歳児クラスについては現状の配置から変更はありません。ご理解・ご協力よろしくお願いいたします。  
※配置図については、裏面をご参照ください。

## 2 ご質問に対する市の考え方について

Q1 工事について、他の材料等の遅れはもうありませんか。また、竣工時期は7月末から、再度遅れるようなことはありませんか。


A1 鉄骨の納入時期も確定し、現状のところでは納期の遅れは聞いておりません。竣工時期については、現在7月末の竣工を目指して作業に取り組んでいるところです。しかしながら、今後災害の発生等予期せぬ事態が発生した場合には、スケジュールを再度検討せざるを得ない場合もありますので、ご了承いただきますようお願いいたします。

Q2 いただいた資料のスケジュールについてですが、AからBとなっていますが、一番最初に提示いただいたスケジュールからの遅れが分かりませんので、A→B→Cとして、当初のスケジュールをAとして記載していただきたいです。

A2 以下図のとおり当初からの経緯がわかるようにスケジュール図を掲載させていただきますので、ご参照いただきますよう、よろしくお願いいたします。


**A 当初工事スケジュール**

- ・新園舎建築工事 平成30年 7月～平成31年 1月末
- ・既存園舎解体・新園庭整備工事 平成31年 2月～平成31年 6月末
- ・仮園庭等復旧工事 平成31年 7月～平成31年 7月末

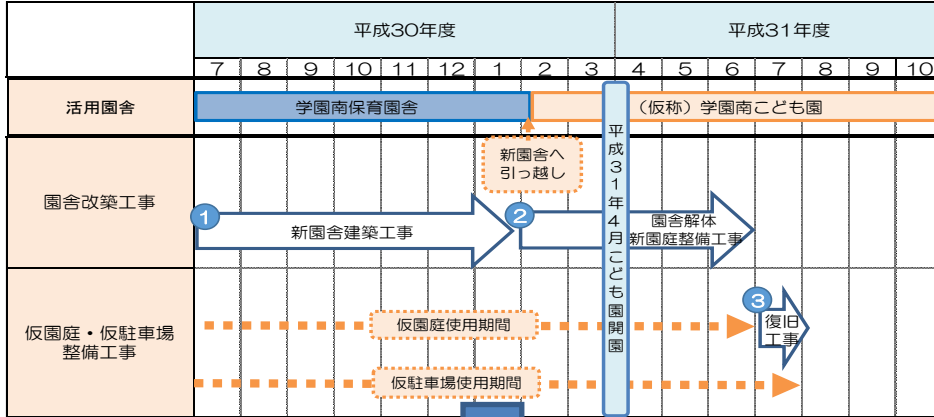


**B 10月時点（工事開始時点）でのスケジュール**

- ・新園舎建築工事 平成30年10月～平成31年 5月中頃
- ・既存園舎解体・新園庭整備工事 平成31年 6月～平成31年 9月末
- ・仮園庭等復旧工事 平成31年10月～平成31年10月末

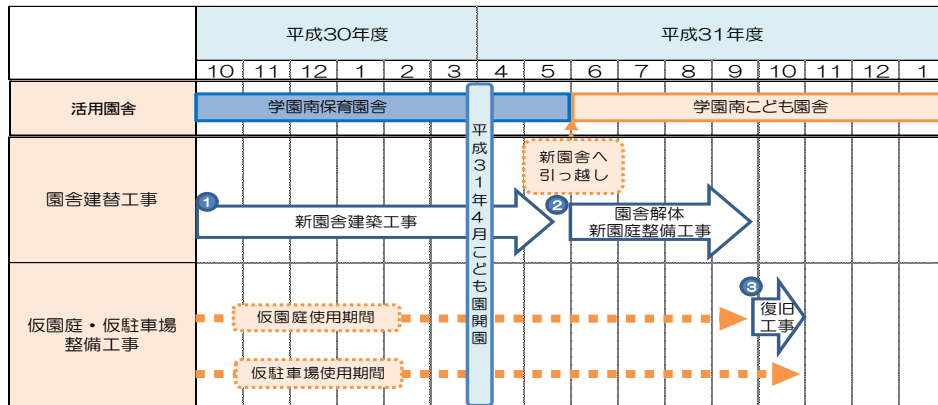

**C 現時点でのスケジュール**

- ・新園舎建築工事 平成30年10月 ～平成31年 7月末
- ・既存園舎解体・新園庭整備工事 平成31年 8月中旬～平成31年12月中旬
- ・仮園庭等復旧工事 平成31年12月末 ～平成32年 1月中旬

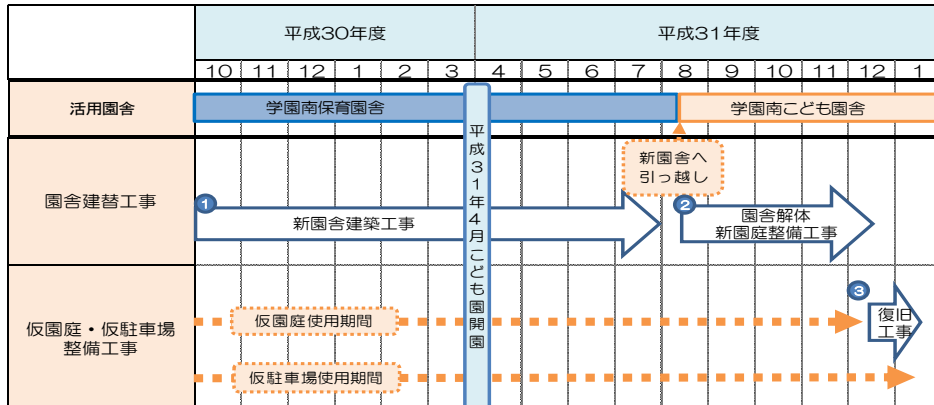

Q3 仮駐車場が満車になった際に、仮園庭を開放して誘導しますと当初説明されていましたが、4月から状況もかわるので、そういった対応はしていただけるのでしょうか。

A3 こども園にはなりますが、1号認定園児は現時点で18名であり、主な生活時間は9時から14時と生活時間が違うので、大きく状況が変わることありませんので、ご安心いただければと思います。4月の状況については、確認させていただき、必要であればそういった対応をさせていただきます。

Q4 3月15日に9時から11時までの間で、卒園式があるので、工事を中止してもらいたいです。またリズム室の窓の養生を卒園式の際は気になるのとってほしいです。

A4 リズム室の窓の養生につきましては、卒園式の際は毎回カーテンを閉めておりますので、問題ありません。また、卒園式の際の工事の実施状況については、工事業者と相談させていただきます。

Q5 4月のこども園開園時から2歳児の1部屋を5歳児が使用するというのですが、1号認定園児が入園してくるので、生活時間が違うことで2歳児の午睡に影響はでてこないのでしょうか。また、トイレの大きさや数、仕切り壁がないことについては、どのように対応されるのでしょうか。

A5 こども園開園当初は1号認定の4、5歳児の園児数が少ない傾向にあり、来年度の1号認定の5歳児は0名のため、生活時間の違うことによる影響はありません。また、トイレにつきましては、2歳児用のトイレを使用することになりますが、大きさについては、園との相談した結果、使用に問題ないと考えております。また、個数については足りない場合は近くのリズム室のトイレがあるためそちらも活用しながら対応させていただきます。また、仕切り壁については簡易なものになりますが、目隠しできるよう対応させていただきます。

#### 学園南保育園のこども園移行に関する問い合わせ先

(担当) 山本 ・ 北野

[ TEL ] 0742-34-4792 [ FAX ] 0742-34-4798

[ MAIL ] kodomoseisaku@city.nara.lg.jp

[ 市立幼保施設の再編に関する市のホームページ ]

<http://www.city.nara.lg.jp/www/genre/0000000000000/13660668363>

